transdev

N/Ref. **551**

PROJET DE PERFORMANCE | *PERFORMANCE PROJECT*

NOTE DE PROJET
PROJECT BRIEF

Date *Date*	Statut *Status*	Demandeur *Requester*	Distribution *Distribution*
4 Mai 2026	Initial	Henri Eckern	Interne

Ce document formalise le lancement du projet par une première validation ('GO'). Il est établi et transmis par l'initiateur du projet. Ce livrable a pour objectif de présenter les principales caractéristiques du projet et d'en offrir une vision globale et structurée.

This document formalizes the project launch through an initial approval ('GO'). It is prepared and submitted by the project initiator. This deliverable aims to present the project's key characteristics and provide a clear, structured overview.

Responsable du succès du projet | *Project Sponsor*
Pierre Zivec

Chef de projet | *Project Manager*
Henri Eckern

Équipe de projet | *Project Team*
Henri Eckern
Matteo D'Alena

Parties prenantes | *Stakeholders*
Directeurs(ices) de maintenance provinciaux
Équipes de maintenance Canada

ASSISTANT VIRTUEL 'GREG BOULON' ('GREG BOLT' EN ANGLAIS)

Enjeux et problèmes à résoudre | *Challenges and issues to address*

Répondre à la difficulté croissante d'accès à l'information technique pour les mécaniciens, alors que celle-ci est fragmentée entre de multiples sources et souvent complexe à exploiter rapidement. Cette situation peut ralentir les diagnostics, augmenter les temps d'immobilisation des véhicules et générer des risques d'erreur. Il s'agit donc de mieux valoriser et structurer les connaissances existantes afin d'orienter plus efficacement les équipes vers des pistes de diagnostic fiables, d'améliorer la productivité des ateliers et de renforcer la qualité des interventions.

Objectifs | *Objectives*

Mettre à disposition des mécaniciens un agent IA capable de les accompagner au quotidien dans leurs activités de diagnostic et de maintenance. Cet outil doit leur permettre de trouver rapidement les informations pertinentes issues des manuels, procédures et historiques, et de les orienter vers des pistes de diagnostic adaptées à leur situation. À travers cet agent, réduire les temps de recherche et d'analyse, accélérer la prise de décision en atelier et améliorer la qualité globale des interventions, en valorisant les connaissances techniques déjà disponibles dans l'organisation.

Périmètre | *Scope*

Ateliers de maintenance et leurs techniciens des zones suivantes :

- Atelier de BELOEIL (QC) pour 5 utilisateurs
- Atelier de SUDBURY (ON) pour 5 utilisateurs
- Atelier de KITIMAT (BC) pour 5 utilisateurs

Livrables | *Deliverables*

Le principal livrable est un agent IA nommé *Greg Boulon* (*Greg Bolt* en anglais), intégré aux outils Office existants. Cet agent s'appuie sur les connaissances techniques disponibles en format digital (manuels constructeur, documents PDF, procédures, etc.) pour répondre aux questions des mécaniciens de manière simple et opérationnelle. Il est accessible en français, en anglais et en espagnol, afin de s'adapter aux différents utilisateurs et contextes terrain.

Approche et faisabilité | *Approach and feasibility*

Faisable en s'appuyant sur les capacités de Copilot Studio pour structurer et exploiter les connaissances techniques existantes.

Dépend fortement de la disponibilité et de la qualité des informations (manuels, procédures, historiques) en format digital.
Nécessite un accès aux outils (Copilot Studio) ainsi que la mise à disposition des licences associées.
Peut être déployé progressivement en s'intégrant aux outils actuels et en enrichissant la base de connaissances dans le temps.

ICP et mesure des objectifs *KPI and performance measurement*	**Impact en cas de non-réalisation ou réalisation tardive** *Impact of non-delivery or delayed delivery*
- Taux d'évaluation agentique : objectif 95% de confiance - Taux d'utilisation : objectif de 7 requêtes par emplacement par jour (DLR) - Qualité d'auto-analyse : objectif de 1 auto-analyse par requête (positive)	Faible.

Coûts prévisionnels et budget | *Estimated costs and budget*

Description	*Description*	**Montant**	*Amt.*	**CC**	*Cost ctr.*
*** MS Copilot Credit value as 1CR=0.01362CAD$			
*** All amounts in CAD$			
MS Copilot Studio Licence Creator (1x3 months)	600.00$	Perf.
MS Copilot Credits (driven by knowledge, tenant graph rounding)	1,100.00$	Perf.
MS Copilot Credits (driven by knowledge, non-tenant GR, files)	20.00$	Perf.
MS Copilot Credits (driven by agent tools)	250.00$	Perf.
MS Copilot Credits (driven by agent flows)	15.00$	Perf.
*** Account for a 10% overspend as cost control is very opaque	198.50$	Perf.
Estimated taxes (QST/PST)	327.00$	Perf.
Estimated cost of software	**2,510.50$**	
Kiosks or equipment required for the user experience	3,000.00$	Perf.
*** To be defined as placeholder		
Estimated cost of hardware	**3,000.00$**	
*** Time spent (9 days FTE + 9 days FTE Intern)	N/A	Perf.
Estimated cost of human ressources	**N/A**	
Estimated project cost	**5,510.50$**	

Phases de planification | *Planning phases*


1. Récupérer les documentations digitales de tous les ateliers concernés (2W).
2. Lancer les entrainements de connaissances de l'agent (1W).
3. Essais et preuves de la qualité d'auto-analyse (1W).
4. Déploiement aux zones de test (1W).
5. Phase d'essai et de preuve de qualité (4-6W).
6. REX

Évaluation du risque ou référence de la feuille de risque *Risk assessment or risk register reference*	**Programme(s) associés** *Related program(s)*	**Interdépendances** *Dependencies*
Voir annexe 1 Voir feuille de risque 551 GREG BOULON.	MS Teams MS Copilot MS Copilot Studio	Aucune.

Évaluation du degré d'implication des TI/SI/BI | *Assessment of IT/IS/BI involvement level*

Acquisition et gestion des licences – Sebastien Boudrias.
Gestion des licences – IT.
TBD

Annexe 1 : Risques associés au projet (voir feuille de risque 551 GREG BOULON)

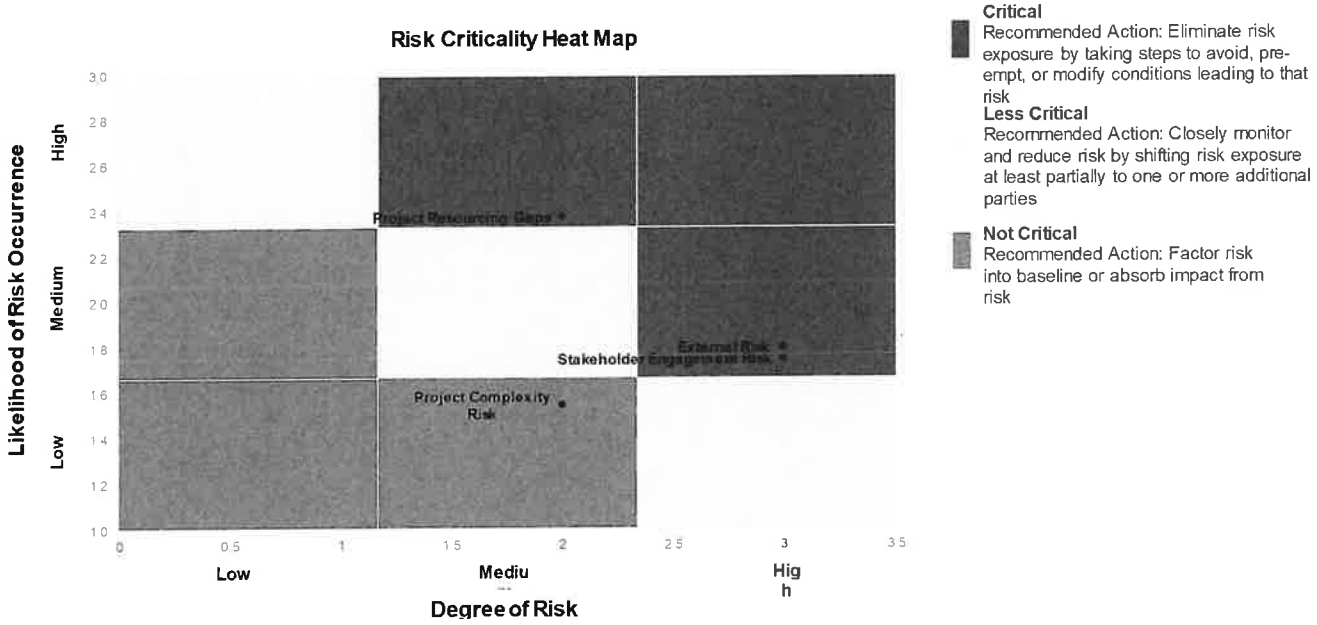

Risks & Associated Risk Factors	Risk Level
Project Resourcing Gaps	**Critical**
Project Manager Experience	Medium
Confidence in Resource Forecasting	Medium
Project Team Experience	High
Project Manager Availability	High
Project Team Availability	High
Familiarity with Project Team	High
Time Zone Proximity	Medium
Project Team Skills	Medium
Stakeholder Engagement Risk	**Critical**
Clarity of Stakeholder Roles and Responsibilitie	Medium
Stakeholder Commitment	Low
Stakeholder Communication Approach	High
Sponsor Advocacy	Low
External Risk	**Critical**
Third-Party Vendors	Low
Regulatory Environment	High
Macroeconomic Environment	Low
Political Environment	Low
Technology Environment	High

Risks & Associated Risk Factors	Risk Level
Project Definition Risk	**Not Critical**
Project Alignment to Strategic Goals	Low
Project Benefits Definition	Medium
Project Scope Clarity	Low
Definition of Project Deliverables/Outputs	Low
Project Complexity Risk	**Not Critical**
Extent of Customer Impact	Medium
Level of Business Change	Medium
Level of Technology Change	High
Duration	Low
Project Cost	Low
Project Team Size	Low
Requirements Definition	Medium
Level of Project Interdependencies	Low
Number of Stakeholder Groups	Low
Procedural/Policy Changes	Low
Required User Training	Medium
